
Cannelle

PALADIN AEGIR 11,29 m de 1989
(ex Bohémer)



AVANCEMENT
NOEL 2008 / NOEL 2010

L'ETAT INTERIEUR AVANT



Situation initiale (après
démontage des façades de la
cuisine)

Table à carte d'origine



LA MODIFICATION DE LA DESCENTE



Changement de la cloison salle d'eau / descente / cuisine avec rajout d'une cloison basse à la place d'un oméga



La nouvelle descente est beaucoup plus confortable
Un équipement intégré dans les marches abrite le tableau moteur


LA SALLE D'EAU

Avant : il n'y pas de salle d'eau. Les toilettes étaient derrière un rideau

Après : on n'a pas déplacé les toilettes mais en décalant la cloison, on peut maintenant s'isoler et fermer la porte derrière soi !



Vue du carré

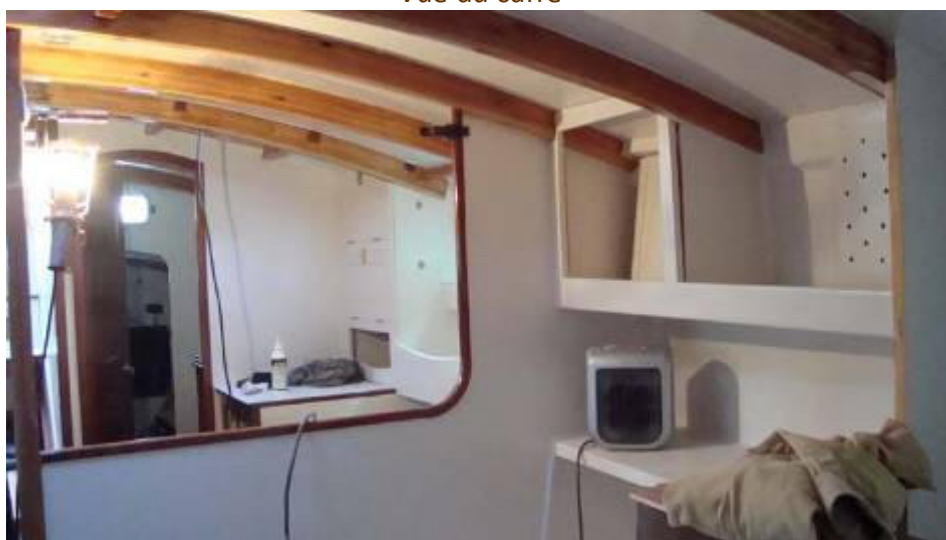

LA CUISINE

Avant



Après



Son orientation ne bloque plus la descente
Il y a plus de rangement (poubelle intégrée au bout de l'évier)

Il y aura en plus un four sur cardan

Le hublot apporte de la lumière

- Toutes les cloisons transversales sont stratifiées à la coque et les façades sont vissées par-dessus.
- Les cloisons longitudinales basses sont stratifiées à la coque et aux transversales
- Les cloisons longitudinales hautes sont collées à l'époxy



LE CARRÉ



Avant



Retrait des anciennes banquettes du carré avant réfection
Pose des nouvelles façades de banquettes du carré : joints congés + strates

Après

- Deux hublots ont été posés de chaque côté
- Pose d'équipets et un placard au-dessus des banquettes du carré



LA TABLE A CARTE

Avant :

- Pas d'assise
- Matériel électrique et équipements électroniques disparates avec des câblages aussi nombreux que désordonnés



Après :

- Enfin, on pourra s'asseoir !
- Il y a de nombreux équipements pour le rangement
- Tout le câblage sera caché



L'EXTERIEUR

Été 2010 : on profite des températures pour faire la jupe et les peintures extérieures



Au niveau du gouvernail :

- Réduction de l'écart entre l'aileron et le safran
- Réfection de la tête de safran (romaillet à la place d'une partie pourrie)
- 2 couches d'époxy sur l'ensemble
- 2 couches d'époxy + graphite sous la flotaison

L'antifouling sera fait au moment de la mise à l'eau

La métamorphose de Bohémer à Cannelle



PRECISIONS SUR L'AGENCEMENT INTERIEUR



- Pose des hublots du carré (2 à bâbord, 2 à tribord)
- la table à carte prend forme
- les équipets du carré



- Cloison de renfort des cadènes (24 mm) avec contreplaqué en contreplaqué
- Inserts aux trous des boulons
- Le tout stratifié à la coque
- Les cloisons d'équipets sont collées au joint congé époxy

AUJOURD'HUI 02/01/2011

Carré vu de la couchette avant



Carré bâbord



Vu les températures, le travail est limité actuellement à la pose de l'électricité.

Parmi les tâches les plus importantes restant à faire à l'intérieur, il y a :

- Le circuit électrique
- L'électronique
- Les vannes et circuits d'eau
- La peinture des fonds et des coffres
- La pose du plancher
- La création d'une cloison d'abordage avec fermeture étanche entre la soute avant et la couchette

Dans l'immédiat, on ne modifie pas la couchette arrière

Livraison du mât Selden prévue fin février ; mâtage en mars, et voiles à poste en avril !
